



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : MONTEVERDI GIANPAOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1414 del 19/10/2021

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - PROGETTO SP 24 DI TORNOLO KM 3+300 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E OPERE DI RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOTTOSCARPA - INTERVENTO A) - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO SVINCOLO CAUZIONE (CUP D43D19000200002 CIG 7988823949)

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Premesso:

che con Decreto Presidenziale n. 165/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo: "SP 24 DI TORNOLO KM 3+300 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E OPERE DI RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOTTOSCARPA INTERVENTO A)" dell'importo complessivo € 141.500,00 ;

che con determinazione dirigenziale n. 865 del 30/07/2019 è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei lavori denominati "SP 24 DI TORNOLO KM 3+300 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E OPERE DI RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOTTOSCARPA INTERVENTO A)" alla ditta GRENTI SPA con sede in Solignano (PR) via Marconi n.6 p.iva 01514520343 , che ha offerto un ribasso del 2,10% (corrispondente ad € 2.343,25 di ribasso) per un importo contrattuale di € 113.615,75 (comprensivo di € 4.375,36 di oneri della sicurezza) oltre IVA di legge pari ad € 24.995,48 e così per complessivi € 138.611,23;

che con Determinazione Dirigenziale n. 927 del 21/08/2019 si è proceduto all'aggiudicazione alla ditta GRENTI SPA con sede in Solignano (PR) via Marconi n.6 p.iva 01514520343, per l'importo di € 113.615,75 (comprensivo di € 4.375,36 di oneri della sicurezza) oltre IVA di legge pari ad € 24.995,48 e così per complessivi € 138.611,23;

che a seguito del Dispongo Presidenziale prot. n. 21892 del 31/07/2019 il precedente Rup Dott. Gabriele Annoni è stato sostituito dall'Ing. Gianpaolo Monteverdi;

che con il decreto presidenziale n. 59 del 08/03/2021 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 2020 dell'Ente, comprendente le risultanze della ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 del Servizio Viabilità come da determina n.182 del 24/02/2021, dove sono comprese le reiscrizioni per esigibilità posticipata del progetto in oggetto al Bilancio 2021, precedentemente inserito nella programmazione delle Opere Pubbliche 2020-2022 elenco annuale 2020 come da DP.242/2019 e successive integrazioni;

Verificato che il CUP D43D19000200002 - CIG 7988823949 ;

Considerato

che i lavori sono stati ultimati in data 02/07/2021;

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Mesti, in data 06/07/2021, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a € 113.593,90 comprensivo di € 4.375,36 per oneri della sicurezza, oltre iva;

che durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto;

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice il credito di € 113.593,90 oltre iva di legge pari ad € 24.990,66 e così per complessivi € 138.584,56, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

che l'impresa al momento del perfezionamento del contratto ha costituito la cauzione mediante Polizza Fidejussoria n. 1531.00.27.2799768910 del 09/08/2019 rilasciata da 8 SACE SIMEST con sede legale Piazza Poli, 42 CAP 00187 Roma, per un importo di € 3.976,55 ;

che per il sottoscritto Responsabile del Procedimento non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012.

Visti:

il D.P.R. n.207/2010;

il D.Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso

DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori " PROGETTO SP 24 DI TORNOLO KM 3+300 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E OPERE DI RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOTTOSCARPA INTERVENTO A)", redatto e sottoscritto dal Geom. Antonio Mesti, in data 06/07/2021, depositato in copia originale presso il Servizio Viabilità ed Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, con un importo complessivo dei lavori di € 113.593,90 comprensivo di € 4.375,36 per oneri della sicurezza, oltre iva;

di liquidare la rata a saldo alla ditta GRENTI SPA con sede in Solignano (PR) via Marconi n.6 p.iva 01514520343 la somma di € 113.593,90 oltre iva di legge pari ad € 24.990,66 e così per complessivi € 138.584,56 quale importo della rata a saldo dei lavori in oggetto;

di dare atto che in riferimento alla componente "lavori" di cui al quadro tecnico approvato si è registrata una economia pari ad € 21,85 IVA esclusa;

di autorizzare lo svincolo, a favore dell'impresa medesima della polizza a garanzia definitiva tramite Polizza Fidejussoria n. 1531.00.27.2799768910 del 09/08/2019 rilasciata da 8 SACE SIMEST con sede legale Piazza Poli, 42 CAP 00187 Roma, per un importo di € 3.976,55;

che la somma di € 138.584,56 rientra nell'impegno 384/21 (sub. 405/21) all'interno del quadro tecnico economico (INTERVENTO A) pari ad € 141.500,00 come da D.P. 165/2019, impegnato al Capitolo 216900220000 Manutenzione stradale strade provinciali, titolo 2°, missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2021;

che la spesa di € 138.584,56 è finanziata - ai sensi del Decreto n. 36 del 29/03/2019 (DPCM del 27/02/2019) della Regione Emilia Romagna - con contributo regionale di totali 920.000,00 accertati al Cap. 140000140500 Contributo da Regione Emilia Romagna Contributi per calamità e lavori di somma urgenza, titolo 4 entrata in conto capitale, tipologia 200 Contributi agli investimenti, acc. 318 del bilancio 2021;

di dare atto che

- il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013;
- presente provvedimento verrà comunicato all'affidatario;
- per il Dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012

Sottoscritta dal Responsabile
(MONTEVERDI GIANPAOLO)
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA
Servizio Viabilità e Infrastrutture

Viale Martiri della Libertà, 15
43123 parma

OGGETTO: SP 24 DI TORNOLO AL KM 3+300 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E OPERE DI RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOTTOSCARPA (INTERVENTO A) – CUP D43D19000200002 CIG 7988823949

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto esecutivo: il progetto esecutivo è stato approvato con Decreto Presidenziale n. 165 del 30/07/2019 per un importo complessivo di € 141.500,00 di cui € 115.959,01 per lavori compresi oneri per la sicurezza pari ad € 4.375,36 ed € 25.540,99 per somme a disposizione.

Assuntore dei lavori: Con determinazione del dirigente n. 927 del 21/08/2019 l'appalto è stato aggiudicato all'Impresa GRENTI SPA, con sede legale in Via Marconi,6 – Solignano (PR) , p. iva 01514520343

Contratto: Il contratto è stato stipulato in data 23/08/2019 al n° 15139 di Repertorio.

Importo contrattuale: l'importo contrattuale, in base all'applicazione del complessivo ribasso d'asta del 2,10% sull'importo soggetto a ribasso e in considerazione dell'importo per oneri di € 4.375,36 non soggetto a ribasso d'asta risulta di netti € 113.615,75 oltre I.V.A. al 22% per complessivi € 138.611,23.

Cauzione: come risulta dal contratto di appalto l'impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante Polizza Fidejussoria n. 1531.00.27.2799768910 del 09/08/2019, rilasciata da SACE SIMEST con sede legale Piazza Poli, 42 CAP 00187 Roma, per un importo di € 3.976,55

Consegna dei lavori: La consegna dei lavori è avvenuta in data 11/11/2019 come risulta dal relativo Verbale. Il tempo utile stabilito per dare compiuti i lavori è stato fissato in 90 giorni (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti da tale data, per cui il termine di ultimazione scadeva il giorno 08/02/2020

Sospensione e ripresa dei lavori: i lavori furono sospesi con verbale n.1 del 15/11/2019 e ripresi con verbale N.1 del 23/03/2021, furono nuovamente sospesi con verbale n. 2 il 12/04/2021 e ripresi con verbale n. 2 il 28/04/2021 pertanto i lavori rimasero sospesi per 510 gg e la nuova data di fine lavori il è il 02/07/2021

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 02/07/2021 come accertato con emissione del relativo certificato di ultimazione alla stessa data

Subappalti: Non sono stati autorizzati subappalti

Danni da forza maggiore: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori

Certificati di acconto: durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto

Avvisi ad opponendum: non sono state avanzate opposizioni entro il termine legale di pubblicazione degli avvisi.

Conto finale: il conto finale è stato redatto in data 06/07/2021 ed importa complessivamente netti:

per lavori e somministrazioni€ 113.593,90 +IVA al 22%

Riserve dell'impresa: l'impresa ha firmato il conto finale senza apporvi riserve.

Infortuni in corso di lavoro: durante i lavori non è avvenuto nessun infortunio.

Assicurazioni sociali: dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, richiesto all'ultimazione dei lavori, è emersa la regolarità della posizione dell'impresa esecutrice nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Collaudo: L'atto formale di collaudo, ai sensi delle vigenti normative in materia di Opere Pubbliche, viene sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.

Cessione di credito da parte dell'impresa: GRENTI SPA, con sede legale in Via Marconi,6 - Solignano (PR) , p. iva 01514520343 non ha effettuato alcuna cessione dei suoi crediti.

Direzione dei lavori: I lavori sono stati diretti dal Geom. Antonio Mesti dell'Amministrazione Provinciale di Parma.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il giorno 06/07/2021 è stata effettuata dal sottoscritto Geom. Antonio Mesti - Direttore dei Lavori , presente il Sig. Franco Giumelli per l'impresa aggiudicataria una visita sulla Strada Provinciale interessata dai lavori e si è accertato che le opere realizzate si presentano in buono stato di conservazione.

Pertanto, considerato:

- che i lavori corrispondono alle prescrizioni e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde alle annotazioni riportate sullo Stato Finale dei lavori;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile;
- che l'Impresa ha provveduto all'assicurazione dei propri operai presso gli Istituti assicurativi INAIL ed INPS - sedi competenti;
- che non sono state effettuate occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati;
- che l'ammontare della spesa complessiva è inferiore all'importo contrattuale

CERTIFICA


che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa GRENTI SPA, con sede legale in Via Marconi,6 - Solignano (PR) , p. iva 01514520343 in base al contratto n° 15139 di Rep. del 23/08/2019 sono stati regolarmente eseguiti e si liquida il credito dell'impresa come segue:

a. per lavori e somministrazioni€ 113.593,90
(compreso € 4.375,36 per oneri sicurezza)

oltre ad I.V.A, 22% pari ad € 24.990,66 e così per complessivi € 138.584,56 dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato.


Parma, lì 06/07/2021

L'impresa
GRENTI SPA




GRENTI S.p.A.
Via Marconi, 6 - Tel. 0525/54542 - Fax 54568
43046 SOLIGNANO (PARMA)
Partita IVA n. 01514520343

Il Direttore dei Lavori
Geom. Antonio Mesti



Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gianpaolo Monteverdi

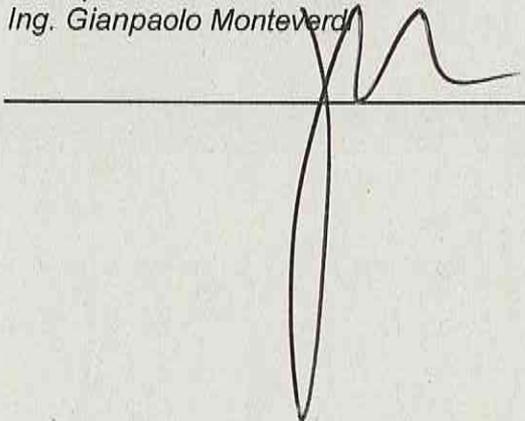



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **1414 / 2021**

Proposta n. 3573/2021

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - PROGETTO SP 24 DI TORNOLO KM 3+300 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E OPERE DI RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOTTOSCARPA - INTERVENTO A) - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO SVINCOLO CAUZIONE (CUP D43D19000200002 CIG 7988823949)

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 19/10/2021

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale
