



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1040 del 16/09/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - MESSA IN SICUREZZA DEI MANUFATTI POSTI LUNGO LA SP13 "DI CORNIGLIO" AL KM 24+750 CIRCA LOC. CORNIGLIO E SULLA SP 17 "DI TRAVERSETOLO" AL KM 38+700 IN LOC. CERETOLO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLEMENTIVA (CUP: D97H19002550005)

IL RESPONSABILE DELL'U.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E
MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la Determinazione Dirigenziale n. 504/2020 di proroga del conferimento di incarico della P.O. e il relativo Atto di Delega;

PREMESSO:

che il CUP è il seguente: D97H19002550005

che con Decreto Presidenziale n. 239 del 12/11/2019 si è provveduto ad approvare ai sensi del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 come modificato dalla L.50/2019 la stima dei costi degli interventi, meglio espressi sopra, tra cui quello denominato "MESSA IN SICUREZZA DEI MANUFATTI POSTI LUNGO LA SP13 "DI CORNIGLIO" AL KM 24+750 CIRCA LOC. CORNIGLIO E SULLA SP 17 "DI TRAVERSETOLO" AL KM 38+700 IN LOC. CERETOLO per un importo complessivo di € 138.000,00";

che con Determinazione Dirigenziale n. 1433 del 18/11/2019 si è provveduto ad affidare, le prestazioni relative alla progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento denominato: "MESSA IN SICUREZZA DEI MANUFATTI POSTI LUNGO LA SP13 "DI CORNIGLIO" AL KM 24+750 CIRCA LOC. CORNIGLIO E SULLA SP 17 "DI TRAVERSETOLO" AL KM 38+700 IN LOC. CERETOLO all'ing. Marco Morini con studio in via della Costituente, 11 43052 – Colorno (PR) , c.f. MRNMRC72C29C904A – P.IVA 02175130349, per l'importo di € 7.920,00 , oltre ad € 316,80 per oneri (CNPAIA 4%) (regime IVA agevolato) così per un totale di € 8.236,80;

che con Determinazione Dirigenziale n. 266 del 19/03/2020 è stato approvato, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 comma 4, redatto dall'ing. Marco Morini dell'intervento denominato: "MESSA IN SICUREZZA DEI MANUFATTI POSTI LUNGO LA SP13 "DI CORNIGLIO" AL KM 24+750 CIRCA LOC. CORNIGLIO E SULLA SP 17 "DI TRAVERSETOLO"AL KM 38+700 IN LOC. CERETOLO", avente un quadro economico di importo complessivo pari ad euro 138.000,00;

che con Determinazione Dirigenziale n. 409 del 04/05/2020 si è provveduto ad affidare i lavori denominati "MESSA IN SICUREZZA DEI MANUFATTI POSTI LUNGO LA SP13 "DI CORNIGLIO" AL KM 24+750 CIRCA LOC. CORNIGLIO E SULLA SP 17 "DI TRAVERSETOLO"AL KM 38+700 IN LOC. CERETOLO", alla ditta Euredil srl, con sede in via Tanara 20, 43013 Langhirano, P.IVA 01948190341, che ha presentato un ribasso del 5,10% per un importo di contratto pari a € 101.445,77 (di cui € 21.038,67 quale importo della sicurezza) ed € 22.318,07 per Iva al 22% così per complessivi € 123.763,84;

che con Determinazione Dirigenziale n. 627 del 18/06/2020 si è provveduto ad affidare l'incarico di Direttore dei Lavori dell'intervento denominato: "MESSA IN SICUREZZA DEI MANUFATTI POSTI LUNGO LA SP13 "DI CORNIGLIO" AL KM 24+750 CIRCA LOC. CORNIGLIO E SULLA SP 17 "DI TRAVERSETOLO" AL KM 38+700 IN LOC. CERETOLO all'ing. Marco Morini con studio in via della Costituente, 11 43052 – Colorno (PR) , c.f. MRNMRC72C29C904A – P.IVA 02175130349, per l'importo di € 4.500,00, oltre ad € 180,00 per oneri (CNPAIA 4%) (regime IVA agevolato) così per un totale di € 4.680,00;

CONSIDERATO

che i lavori sono attualmente in fase di esecuzione;

che nella fase di esecuzione dei lavori la D.L. ha svolto una puntuale attività di verifica e controllo del progetto, perseguendo obiettivi di ottimizzazione del medesimo;

che per tali ragioni il Direttore dei lavori Ing. Marco Morini ha elaborato una 1^a perizia di variante in corso d'opera;

che la 1^a perizia di variante non comporterà aumento di spesa per l'amministrazione nel rispetto delle somme finanziate e dell'importo del contratto;

che il Responsabile del procedimento ing. Elisa Botta ha accertato la sussistenza delle motivazioni, condizioni e presupposti che legittimano Perizia di Variante per circostanze impreviste e imprevedibili;

che gli elaborati componenti la 1^aperizia di variante in oggetto, tutti firmati per accettazione dall'impresa appaltatrice, vengono depositati presso il Servizio Viabilità e risultano quelli sottoelencati:

- Atto di Sottomissione
- Relazione Illustrativa
- Computo Metrico estimativo di Perizia
- Quadro di raffronto
- Elenco nuovi prezzi

- Analisi nuovi prezzi

PRESO ATTO

che le condizioni di esecuzione sono le stesse di quelle contenute nel contratto già stipulato e che l'Importo di contratto alla Euredil S.r.l. rimane invariato in complessivi € 123.763,84 (Iva compresa);

che i nuovi prezzi unitari sono contenuti nell'apposito Atto di sottomissione per le categorie di lavoro non previste;

che per effetto dell'esecuzione dei lavori di variante sopra esposti si concede un maggiore tempo di esecuzione pari a 14 gg;

che il quadro economico dell'opera rimane confermato per invariati € 138.000,00;

che come Responsabile Unico del Procedimento è confermata l'ing. Elisa Botta, Funzionario del Servizio Viabilità e Infrastrutture;

DETERMINA

di approvare la 1^a Perizia di Variante in corso d'opera non suppletiva, depositata in visione presso il Servizio Viabilità ed in particolare l'Atto di Sottomissione che viene allegato al presente atto;


di confermare il Quadro Economico approvato, per complessivi e invariati € 138.000,00;

di dare atto:

che le condizioni di esecuzione sono le stesse di quelle contenute nel contratto stipulato e che l'Importo di contratto alla Ditta Euredil S.r.l. rimane invariato in complessivi € 123.763,84 (Iva compresa);


che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA
Servizio Viabilità e Infrastrutture

MESSA IN SICUREZZA DEI MANUFATTI POSTI LUNGO
LA SP 13 "DI CORNIGLIO" AL km 24+750 CIRCA IN
LOC. CORNIGLIO E SULLA SP 17 "DI TRAVERSETOLO"
AL km 38+700 IN LOC. CERETOLO

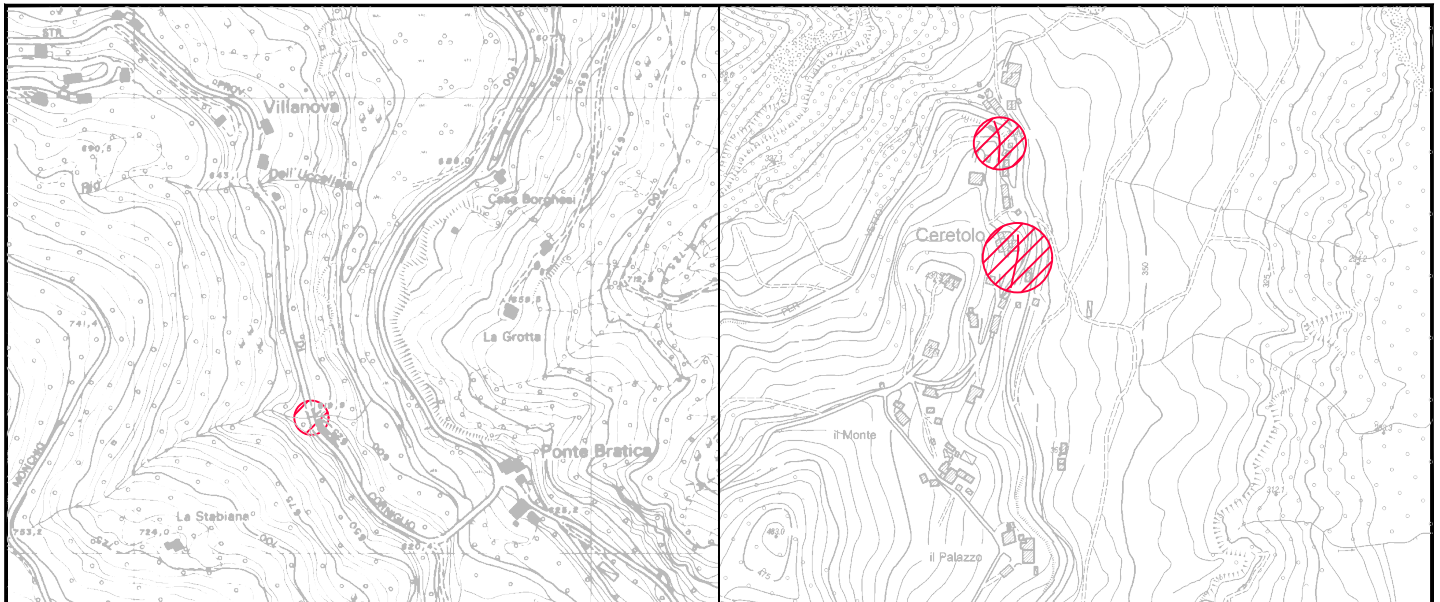

1° PERIZIA DI VARIANTE

OGGETTO: PARTE GENERALE		TAV. N. 1	IL DIRETTORE DEI LAVORI Dott. Ing. Marco Morini _____
TITOLO: ATTO DI SOTTOMISSIONE		SCALA -	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Ing. Elisa Botta
AGGIORNAMENTI:		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE	
REV.	DATA	DESCRIZIONE	
0	07/09/20	EMISSIONE	
		Dott. Ing. Gianpaolo Monteverdi	

PROVINCIA DI PARMA

- - -

Messa in sicurezza dei manufatti posti lungo la SP13 “di Corniglio” al km 24+750 circa loc. Corniglio e sulla SP17 “di Traversetolo” al km 38+700 in loc. Ceretolo

Impresa: Euredil srl, via Tanara, 20 – 43013 Langhirano (PR)

Importo dei lavori a base d’asta: 105.766,91 €

Importo di aggiudicazione al netto del ribasso d’asta: 101.445,77 €

Contratto: Repertorio n. 15172 del 15/06/2020.

1° PERIZIA DI VARIANTE

- - -

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso:

- che l’Impresa Euredil S.r.l. si è aggiudicata i lavori di messa in sicurezza dei manufatti posti lungo la SP13 “di Corniglio” al km 24+750 circa loc. Corniglio e sulla SP17 “di Traversetolo” al km 38+700 in loc. Ceretolo, (Determinazione Dirigenziale n°409 del 04/05/2020);
- che il contratto è stato firmato il 15/06/2020 (repertorio n°15172);
- che si è ritenuto necessario apportare alcune modifiche ai lavori considerati in sede di gara, al fine di garantire la completezza e il miglioramento degli interventi previsti nel progetto originario;
- che è stata redatta dal Direttore dei Lavori una Perizia di Variante per circostanze impreviste e imprevedibili, che non prevede incrementi dell’importo del contratto.

Tutto ciò premesso, il giorno 7 del mese di settembre dell’anno duemilaventi, tra la Dott.ssa Gigliola Gonizzi, Legale Rappresentante dell’Impresa appaltatrice Euredil S.r.l, l’Ing. Marco Morini, Direttore dei Lavori e l’Ing. Elisa Botta, Responsabile del Procedimento, si è stabilito quanto segue:

- 1) l’Impresa Euredil S.r.l. si impegna a eseguire senza riserva alcuna tutti i lavori descritti nell’allegata 1° perizia di variante che risulta composta dai seguenti elaborati:

A – PARTE GENERALE

N. Elab.	Descrizione	Data	Agg.
A.0	ELENCO ELABORATI	07/09/2020	0
1	ATTO DI SOTTOMISSIONE	07/09/2020	0
2	RELAZIONE ILLUSTRATIVA	07/09/2020	0
3	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA	07/09/2020	0
4	QUADRO DI RAFFRONTO	07/09/2020	0
5	ELENCO NUOVI PREZZI	07/09/2020	0
6	ANALISI NUOVI PREZZI	07/09/2020	0

B – PROGETTO DEGLI INTERVENTI

N. Elab.	Descrizione	Data	Agg.
B.1	INTERVENTO AL km 24+750 CIRCA DELL'S.P. 13 DI CORNIGLIO IN LOC. CORNIGLIO	07/09/2020	0
B.2.1	INTERVENTO AL km 38+700 CIRCA DELL'S.P. 17 DI TRAVERSETOLO IN LOC. CERETOLO – MANUFATTO “1”	07/09/2020	0
B.2.2	INTERVENTO AL km 38+700 CIRCA DELL'S.P. 17 DI TRAVERSETOLO IN LOC. CERETOLO – MANUFATTO “2”	07/09/2020	0

- 2) L'Impresa conferma di aver preso piena e completa visione del progetto principale e della perizia allegata al presente atto, pertanto ritiene l'opera perfettamente eseguibile in modo completo nei tempi stabiliti; l'Impresa si dichiara a perfetta conoscenza dei luoghi e del contesto in cui i lavori devono essere eseguiti.
- 3) gli importi di perizia vengono valutati applicando i prezzi di cui all'elenco allegato al contratto principale, integrato con il presente atto dai seguenti nuovi prezzi, anch'essi convenuti al lordo del ribasso d'asta del 5,10%:

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO (Euro)
NP05	Pulizia e sistemazione alveo mediante miniescavatore (12 h) trasportato, calato e risollevato mediante autocarro a cassone ribaltabile delle portata a pieno carico di 190 q.li con gruetta da 3500 kg (8 h)	a corpo	854,99
NP06	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq)	mc	139,34
NP07	Fornitura e posa di segnale in lamiera di alluminio "paletto di delimitazione" dimensioni 20 x 80 cm dello spessore di mm. 25/10 sciolata e rinforzata, completa di attacchi, finiture con smalto grigio a fuoco, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola rifrangente di classe non inferiore a 2 speciale, a pezzo unico completo di staffe e bulloni per attacco al palo di sostegno diametro 60 mm, compresa fornitura e scavo per installazione sostegno, secondo le disposizioni della D.L.	cad	101,00
NP08	Ripresa in breccia della muratura, di opere di difesa del suolo, inclusi il cuci-scuci delle lesioni mediante allargamento delle fessure, rimozione delle parti sconnesse, pulizia, lavaggio, ripristino della continuità muraria con elementi di recupero o simili all'esistente con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a, compresi puntellature, stuccatura, ammorsamenti, spigoli, riseghe e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: muratura di pietrame	mc	594,20

4) Ai fini fiscali si precisa che l'importo complessivo dell'opera (appalto principale con le modifiche contenute nell'allegata 1° perizia di variante) risulta pari a € 101.445,77, comprensivi di € 22.299,87 per oneri sicurezza, al netto dell'I.V.A. di Legge e del ribasso contrattuale, senza incremento dell'importo contrattuale. Tale importo è da considerarsi pienamente remunerativo per l'Impresa in considerazione del lavoro svolto e da eseguire, l'importo di Euro 101.445,77 sopra stabilito è comunque comprensivo di tutto ciò che risulta necessario per dare l'opera completa e perfettamente funzionante al suo scopo. Per tutto quanto non espressamente modificato con il presente Atto e con l'allegata perizia si farà riferimento al contratto principale e alle sue integrazioni.

5) In relazione ai tempi per l'esecuzione dei lavori stabiliti nel contratto principale, conseguentemente alla necessità di elaborare la presente perizia di variante ed eseguire i lavori in aggiunta, viene concessa all'Impresa una proroga di 14 giorni (diconsi quattordici).

Il nuovo termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori viene pertanto stabilito per il giorno 05/10/2020.

A fronte della suddetta proroga l'Impresa rinuncia fin da ora a ogni e qualsiasi richiesta di maggiori oneri e/o compensi per effetto del prolungarsi dei lavori e delle variazioni in essi intervenute a seguito delle cause e degli eventi che hanno motivato la concessione della presente proroga. Per tutto quanto non espressamente modificato con il presente Atto e con l'allegata perizia si farà riferimento al contratto principale e alle sue integrazioni.

6) Vengono allegati al presente Accordo per farne parte integrante e sostanziale i seguenti elaborati:

A – PARTE GENERALE

N. Elab.	Descrizione	Data	Agg.
A.0	ELENCO ELABORATI	07/09/2020	0
1	ATTO DI SOTTOMISSIONE	07/09/2020	0
2	RELAZIONE ILLUSTRATIVA	07/09/2020	0
3	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA	07/09/2020	0
4	QUADRO DI RAFFRONTO	07/09/2020	0
5	ELENCO NUOVI PREZZI	07/09/2020	0
6	ANALISI NUOVI PREZZI	07/09/2020	0

B – PROGETTO DEGLI INTERVENTI

N. Elab.	Descrizione	Data	Agg.
B.1	INTERVENTO AL km 24+750 CIRCA DELL'S.P. 13 DI CORNIGLIO IN LOC. CORNIGLIO	07/09/2020	0
B.2.1	INTERVENTO AL km 38+700 CIRCA DELL'S.P. 17 DI TRAVERSETOLO IN LOC. CERETOLO – MANUFATTO “1”	07/09/2020	0
B.2.2	INTERVENTO AL km 38+700 CIRCA DELL'S.P. 17 DI TRAVERSETOLO IN LOC. CERETOLO – MANUFATTO “2”	07/09/2020	0

Il presente accordo è impegnativo per l'Impresa fin da subito, mentre lo diventerà per la Provincia di Parma solamente dopo la validità dell'atto di approvazione.

Il n° di Partita I.V.A. dell'Impresa Euredil S.r.l. è 01948190341.

Sorbolo: 07/09/2020

Per l'Impresa Euredil

Il Direttore dei Lavori

(Dott.ssa Gigliola Gonizzi)

(Ing. Marco Morini)

Per la Provincia di Parma

Il responsabile del procedimento

(Ing. Elisa Botta)
